




## Kvalitetssikring Etagedæk

Blad nr.: 13-04.20  
Side: 1/2

04/2010

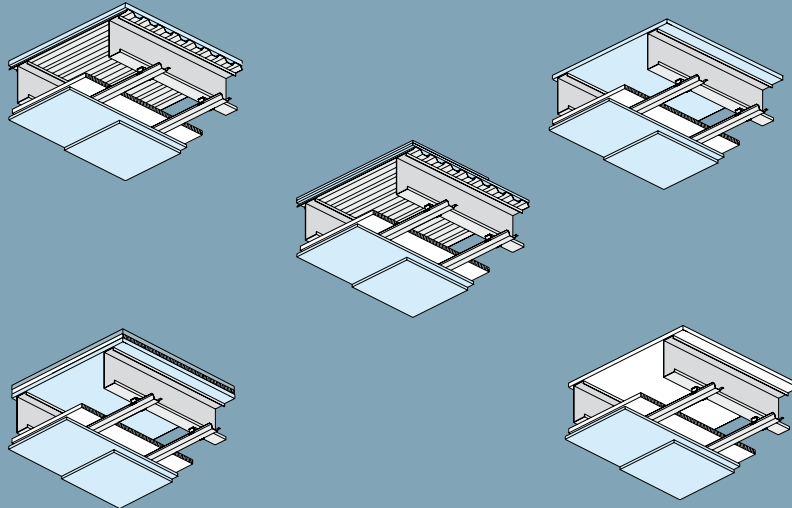

### Generelt

Følgende punkter bør kontrolleres i henhold til udbudsmaterialet.

### Placering

Placering i forhold til højde og udstrækning.

### Stålskelet

Profiltyper.

Profilhøjde.

Godstykkelse.

Antal og placering.

Beslagtype.

Antal og placering.

Skruetype/antal.

Lydbøjlers placering og fastgørelse.

Maks. last 35 kg/lydbøjle, inkl. egenlast.

Monteringsprofilernes placering og fastgørelse til lydbøjlerne.

### Hulrumsisolering

Isoleringsmaterialets type og tykkelse. Normalt anvendes 30 mm mineraluld.

Tilskæring og placering.

Gipsplademontage

Gipsplader, type og antal pladelag.

2x15 mm Secura Board.

### Fastgørelse af gipsplader

Skruetypeper.

Skruer holdes 10-15 mm fra langkanter.

Skruer holdes 15-20 mm fra kortkanter og skårne kanter.

Skrueafstand.

Skruer undersænkes 0,5-1,0 mm.

### Fugning

Lydfuger placeres i 1. pladelag ved tilslutning til andre bygningsdele.

Afslutninger

Omfang, type og placering af foreskrevne spartelprofiler.

### Loftoverflade

Planhedstolerancer.

### Undergulv

Trapezplade monteres med overlapninger og fastgøres med profilskruer til de bærende profiler.

Skrueantal.

Gipsundergulv, type og montage.

# Kvalitetssikring - Etagedæk Kontrolskema

<b>Sag</b>									
<b>Bygning</b>				<b>Etage</b>					
<b>Specifikation af bygningsdel</b>									
<b>Omfang af kontrol:</b>				<b>Tolerancekrav:</b>					
				Afsætning (opmærkning) (±) mm: _____					
				Planhed, færdig gulv/loft (±) mm: _____					
<b>Kontrol udføres ved:</b> M: Måltagning V: Visuel (foto) registrering		<b>Accept Kryds af</b>		<b>Kontrolleret Dato/Sign.</b>		<b>Bemærkninger</b>		<b>Udbedret Dato/Sign.</b>	
<b>Placering</b>									
Højdeplacering		M		Ja Nej					
Øvrige placering		M		Ja Nej					
<b>Stålskelet</b>									
Profiltyper og dimensioner		M		Ja Nej					
Profilplacering		M		Ja Nej					
Beslag og skrueantal		V		Ja Nej					
Lydbøjler		M		Ja Nej					
Monteringsprofiler		M		Ja Nej					
<b>Hulrumsisolering</b>									
Type og mængde		V		Ja Nej					
Tilskæring		V		Ja Nej					
<b>Gipsplademontage</b>									
Type og antal pladelag		V		Ja Nej					
Forskudte pladesamlinger		V		Ja Nej					
<b>Fastgørelse af gipsplader</b>									
Skrueafstande		M		Ja Nej					
Skrueundersænkning		V		Ja Nej					
<b>Fugning</b>									
Lydfuger		V		Ja Nej					
<b>Loftoverflade (÷ spartling)</b>									
Planhedstolerancer		M		Ja Nej					
<b>Undergulv</b>									
Trapezplade		V		Ja Nej					
Gulvgipsplader, typer		V		Ja Nej					
Fastgørelse		M		Ja Nej					
<b>Andet</b>									
		-		Ja Nej					
<b>Endelig accept</b>									
Dato				Ansvarlig for kvalitetssikring, underskrift					
